

Moquegua, 09 de octubre del 2020

CARTA N° 016-2020-G/CC ESERGEN EIRL

SEÑORES: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Atención:
Gerencia de Logística y Servicios Generales

Residente de Obra:

Ing, Jhon Hinojosa Zeballos

Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N° 368 JESÚS DE NAZARET DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

ASUNTO: AMPLIACION DE PLAZO O/S N° 4046.

Por medio del presente me es grato dirigirme a Uds. Con la finalidad de solicitar Ampliación de Plazo, ya que venimos realizando los Trabajos según Orden de Servicio N° 4046, con SIAF N° 8809, "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL N° 368 JESÚS DE NAZARET DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA", que para la culminación de dichos trabajos se tiene el retraso de los trabajos por parte de la Obra, como es el recién vaciado del techo del Pabellón de las Aulas del bloque 01, (29/09/20) y que para su desencofrado tiene una duración de 15 días, fecha de desencofrado 15/10/20, según lo coordinando con el Residente de Obra, y estando dentro del plazo de ejecución es que solicito la ampliación de plazo de 25 días para la culminación del Servicio, siempre en cuanto se haga entrega de los ambientes en mención para su culminación de los trabajos de Tarrajeo de ambientes en su debida oportunidad.

Para lo cual Solicito a Ud., una Prórroga de 25 días Calendarios, para poder culminar debidamente dicho servicio, por lo que solicito su comprensión y se SIRVA DISPONER a la instancia que corresponda para no incurrir en penalidad de cumplimiento.

Seguro de su atención y comprensión me suscribo de Usted.

Atentamente,




CONSTRUCTORA Y CONSULTARIA
ESERGEN E.I.R.L.
Hermelinda Cajayanco Cuno
GERENTE
RUC: 20605734589

NOTA: se adjunta panel fotográfico



Constructora y Consultoría
ESERGEN E.I.R.L.
RUC: 20605734589

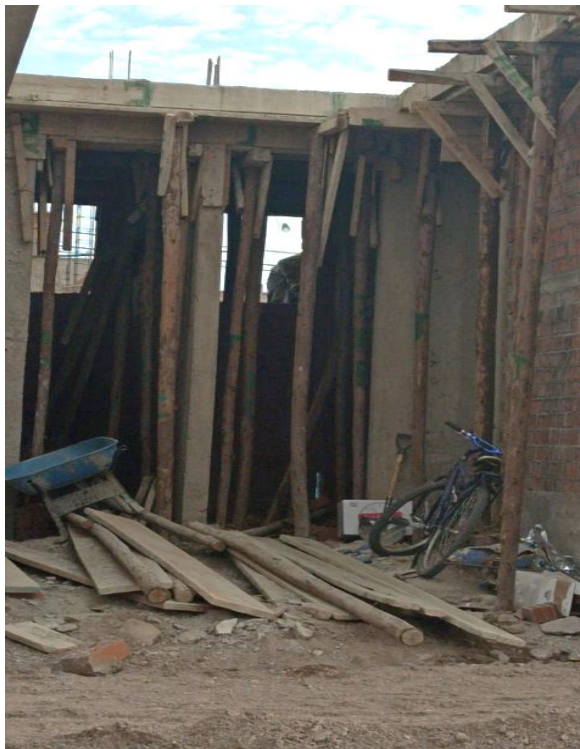

CONSTRUCTORA Y CONSULTARIA
ESERGEN E.I.R.L.
Hermelinda C
Hermelinda Cajayanco Cuno
GERENTE
RUC: 20605734589

OFICINA:
ASOC. CIUDAD NUEVA R7 – 17 SAN ANTONIO –Moquegua
SUCURSAL:

Celular: 971 219044 - TELEFONO: 053-635000
esergen20@gmail.com



Constructora y Consultoría

ESERGEN E.I.R.L.

RUC: 20605734589



CONSTRUCTORA Y CONSULTARIA
ESERGEN E.I.R.L.
Hermelinda
Hermelinda Cajayanco Cuno
GERENTE
RUC: 20605734589
